

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
SECRETARIA DE FINANÇASNota Nº
0000000600
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	08/11/2022	Competência	NOV/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SALGUEIRO-PE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	J. N. CONSTRUTORA LTDA - ME				
Nome Fantasia					
Endereço	RUA RUA PROJETADA 24/MONTE ALEGRE, S/N - NOSSA SRA.DAS GRACAS				
CPF/CNPJ	21.641.207/0001-15	Insc.Municipal	6605	UF	PE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SALGUEIRO	C.E.P	56000000	Comp.	Q-B3A, L-02
		Telefone			



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO			E-mail	
Endereço	PÇ PROF. URBANO DE SA, 00014 CAMARA SANTO ANTONIO 56000000 SALGUEIRO-PE				
CPF/CNPJ	11.351.350/0001-19	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 DO ADITIVO DE VALOR Nº 01, DO CONTRATO Nº 012/2022, DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO, NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022.
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: BANCO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AGENCIA: 0776 / CONTA CORRENTE: 003 / CONTA : 00002413-3
IRRF: 1,5 % = R\$ 187,74

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 702 / 421110100 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	826,08	CSLL	0,00	IRRF	187,74
-----	------	--------	------	------	--------	------	------	------	--------

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	12.516,38	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	12.516,38
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução permitida em lei	5.006,55
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	1.013,82	0-Nenhum	Base de Cálculo	7.509,83
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	5,0000 %
(-) ISS Retido	375,49	b95fc8dg4	ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	11.127,07	http://www.salgueiro.pe.gov.br/	(=) Valor do ISS	375,49

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

MÃO DE OBRA 60% / MATERIAL 40% EMPRESA ENQUADRADA NO LUCRO PRESUMIDO

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 08/11/22 09:16

Hora da emissão: 09:13:48

CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO			
Localização: Praça professor Urbano Gomes de Sá		Contratada: J N Construtora LTDA	
OBJETO:		CNPJ: 21.641.207/0001-15	
Reforma do prédio da Câmara municipal de vereadores do município de Salgueiro PE		Processo Licitatório: 008/2022	
Nº DO BM		Tomada de preço: 001/2022	
INÍCIO DA OBRA		TERMINO DA OBRA	
17/08/2022		04/11/2022	
		VALOR DO CONTRATO	
		R\$ 246.588,46	
		PERÍODO DE	
		28/08/2022 a 04/11/2022	

BM 02 ADITIVO 01

Item	Código	Descrição	Und	Valor Unitário (com BDI)	QUANTIDADE			FINANCEIRO		
					ADITIVO 01	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO	ADITIVO 01	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO
1.1	SERVIÇOS									
1.1.4	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	22,70	59,51		59,51	R\$ 1.086,74	R\$ 0,59	R\$ 1.086,74
1.1.5	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPE CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M	2,60	48,07		48,07	R\$ 1.350,80	R\$ -	R\$ 1.350,80
1.1.11	S00017	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	m2	7,91	27,94		27,94	R\$ 124,97	R\$ -	R\$ 124,97
1.3	ARGAMASSA							R\$ 220,97	R\$ 0,59	R\$ 220,97
1.3.1	S03311	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRACO T2 - 1:3 (CIMENTO/AREIA/ADESIVO BRANCO) REJUNTADO 08/2014	m2	9,63	27,94		27,94	R\$ 8.081,21	R\$ 4.088,57	R\$ 5.486,65
1.3.2	87530	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	41,27	27,94		27,94	R\$ 269,02	R\$ 0,72	R\$ 269,01
1.3.3	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF_06/2014	M2	116,50	56,20		34,30	R\$ 1.153,08	R\$ 3,30	R\$ 1.153,08
1.4	PISO							R\$ 6.659,11	R\$ 4.064,55	R\$ 4.064,55
1.4.4	101727	PISO VINÍLICO SEM-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA, AF_09/2020	M2	223,28	2,90		2,90	R\$ 846,84	R\$ 846,84	R\$ 846,84
1.7	DIVERSOS							R\$ 646,84	R\$ 646,84	R\$ 646,84
1.7.1	96368	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS, AF_06/2017_P	M2	229,40	1,68		1,68	R\$ 1.344,74	R\$ 1,344,74	R\$ 1.344,74
1.7.2	COMP. 1	LUMINÁRIA DE TETO LED LONGA - APLIKLED BIVOLT LUZ BRANCA 40 W 5000K, OSRAM, COMPLETA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	137,05	7,00		7,00	R\$ 385,39	R\$ 385,39	R\$ 385,39
1.7	EXTRAS							R\$ 959,35	R\$ 959,35	R\$ 959,35
	COMPOSIÇÃO 1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, COM EMBOCAMENTO EM CADA ENCAIXE DE TELHA	M2	83,49	280,16		280,16	R\$ 32.465,00	R\$ 5.455,64	R\$ 30.592,89
84232		AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO, AF_07/2019	Un	3,08	1.920,00		1.920,00	R\$ 23.390,56	R\$ -	R\$ 23.390,56
97647		REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M²	3,37	280,16		280,16	R\$ 5.932,80	R\$ -	R\$ 5.932,80
11.05.070		CAPEAO DE REVESTIMENTO EM MASSA ÚNICA, PARA ALVENARIA DE 15CM DE ESPESSURA, COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4, COM ADICAO DE 130 KG DE CIMENTO, ESPESSURA DE 20MM, INCLUSIVE CHAPISCO NO TRACO 1:3.(SEDUC)	M	7,21	59,00		59,00	R\$ 944,14	R\$ -	R\$ 944,14
87273		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_06/2014	M²	88,65	19,99			R\$ 425,39	R\$ -	R\$ 425,39
99841		GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXAÇÃO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AF_04/2019_P	M	1.255,26	4,90		4,90	R\$ 1.772,11	R\$ -	R\$ -
87622		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M²	52,77	1,15		1,15	R\$ 6.150,77	R\$ 6.150,77	R\$ 6.150,77
101846		QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UNID	160,16	1,00		1,00	R\$ 60,55	R\$ 60,55	R\$ 60,55
101876		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UNID	84,16	1,00		1,00	R\$ 160,16	R\$ 160,16	R\$ 160,16
								R\$ 84,16	R\$ 84,16	R\$ 84,16
								R\$ 12.516,38		

LOCAL: Praça professor Urbano Gomes de Sá Salgueiro/PE

OBJETO: Reforma do prédio da Câmara municipal de vereadores do município de Salgueiro PE

MEMORIA DE CÁLCULO - 2 BM ADITIVO 01

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA	REPETIÇÕES	TOTAL
S00017	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	m2					
	SALA 1		3,10	1,40		1,00	4,34
			2,50	1,40		2,00	7,00
	SALA 2		3,00	1,00		1,00	3,00
	SALA 3		3,00	1,25		1,00	3,75
			0,70	1,25		1,00	0,88
	SALA 4		2,55	1,50		1,00	3,83
			2,35	1,50		1,00	3,53
			1,00	1,50		1,00	1,50
	SALA 5		2,55	1,30		2,00	6,63
			1,85	1,30		2,00	4,81
	CORREDOR 01		19,63	1,35		1,00	26,50
			1,10	1,35		2,00	2,97
			10,25	1,35		1,00	13,84
	CORREDOR 2		12,00	1,20		1,00	14,40
			1,00	1,20		1,00	1,20
	SALA 6		3,30	1,60		1,00	5,28
			2,50	1,60		1,00	4,00
	SALA 7		3,30	1,50		1,00	4,95
			2,55	1,50		1,00	3,83
	SALA 8		3,30	1,30		1,00	4,29
			3,60	1,30		2,00	9,36
	SALA 9		3,30	2,00		2,00	13,20
			2,95	2,00		1,00	5,90
	SALA 10		3,10	2,00		1,00	6,20
			2,75	2,00		1,00	5,50
	SALA 11		3,85	2,00		1,00	7,70
			4,40	2,00		1,00	8,80
			2,00	2,00		1,00	4,00
	HALL DE ENTRADA		1,63	1,60		2,00	5,22
			4,90	1,60		1,00	7,84
	AUDITORIO DA PARTE DO VIDRO PARA DENTRO		5,43	1,60		1,00	8,69
			3,90	1,60		2,00	12,48
			13,30	1,60		2,00	42,56
	FACHADA		1,80	0,80		1,00	1,44
			1,00	1,10		1,00	1,10
			1,20	0,72		1,00	0,86
			1,08	1,10		1,00	1,19
			2,40	0,63		1,00	1,51
			0,70	1,10		1,00	0,77
			1,50	0,50		1,00	0,75
	LATERAL		15,08	0,50		2,00	15,08
	LOCAIS ACIMA DO FORRO		0,60	0,60		1,00	0,36
			1,00	1,00		1,00	1,00
			1,00	1,00		1,00	1,00
			0,60	1,00		1,00	0,60
			0,60	0,60		1,00	0,36
	WC		2,50	2,80		1,00	7,00
						TOTAL	290,98
						SALDO CONTRATO	263,04
						ADITIVO	27,94
						MEDIDO 1 BM ADITIVO	27,86
						SALDO PARA 2 BM ADITIVO	0,08
S03311	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO/AREIA/ ADESIVO BIANCO) - REVISADO 08/2015	m2					
	SALA 1		3,10	1,40		1,00	4,34
			2,50	1,40		2,00	7,00
	SALA 2		3,00	1,00		1,00	3,00
	SALA 3		3,00	1,25		1,00	3,75
			0,70	1,25		1,00	0,88
	SALA 4		2,55	1,50		1,00	3,83
			2,35	1,50		1,00	3,53
			1,00	1,50		1,00	1,50
	SALA 5		2,55	1,30		2,00	6,63
			1,85	1,30		2,00	4,81
	CORREDOR 01		19,63	1,35		1,00	26,50
			1,10	1,35		2,00	2,97
			10,25	1,35		1,00	13,84
	CORREDOR 2		12,00	1,20		1,00	14,40
			1,00	1,20		1,00	1,20
	SALA 6		3,30	1,60		1,00	5,28
			2,50	1,60		1,00	4,00
	SALA 7		3,30	1,50		1,00	4,95
			2,55	1,50		1,00	3,83
	SALA 8		3,30	1,30		1,00	4,29
			3,60	1,30		2,00	9,36
	SALA 9		3,30	2,00		2,00	13,20
			2,95	2,00		1,00	5,90
	SALA 10		3,10	2,00		1,00	6,20
			2,75	2,00		1,00	5,50
	SALA 11		3,85	2,00		1,00	7,70
			4,40	2,00		1,00	8,80
			2,00	2,00		1,00	4,00

Documento assinado digitalmente



VINICIUS ALVES FERREIRA LUSTOSA FALCA
Data: 08/11/2022 01:33:32 -0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

JN CONSTRUTORA LTDA EPP
Stenyo Rizzo Nascimento
Engº Civil
CREA 32.387 - DPE

LOCAL: Praça professor Urbano Gomes de Sá Salgueiro/PE

OBJETO: Reforma do prédio da Câmara municipal de vereadores do município de Salgueiro PE

MEMORIA DE CALCULO - 2 BM ADITIVO 01

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA	REPETIÇÕES	TOTAL
	HALL DE ENTRADA		1,63	1,60		2,00	5,22
			4,90	1,60		1,00	7,84
	AUDITORIO DA PARTE DO VIDRO PARA DENTRO		5,43	1,60		1,00	8,69
			3,90	1,60		2,00	12,48
			13,30	1,60		2,00	42,56
	FACHADA		1,80	0,80		1,00	1,44
			1,00	1,10		1,00	1,10
			1,20	0,72		1,00	0,86
			1,08	1,10		1,00	1,19
			2,40	0,63		1,00	1,51
			0,70	1,10		1,00	0,77
			1,50	0,50		1,00	0,75
	LATERAL		15,08	0,50		2,00	15,08
	LOCAIS ACIMA DO FORRO		0,60	0,60		1,00	0,36
			1,00	1,00		1,00	1,00
			1,00	1,00		1,00	1,00
			0,60	1,00		1,00	0,60
			0,60	0,60		1,00	0,36
	WC		2,50	2,80		1,00	7,00
						TOTAL	290,98
						SALDO CONTRATO	263,04
						ADITIVO	27,94
						MEDIDO 1 BM ADITIVO	27,86
						SALDO PARA 2 BM ADITIVO	0,08
87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2					
	SALA 1		3,10	1,40		1,00	4,34
			2,50	1,40		2,00	7,00
	SALA 2		3,00	1,00		1,00	3,00
	SALA 3		3,00	1,25		1,00	3,75
			0,70	1,25		1,00	0,88
	SALA 4		2,55	1,50		1,00	3,83
			2,35	1,50		1,00	3,53
			1,00	1,50		1,00	1,50
	SALA 5		2,55	1,30		2,00	6,63
			1,85	1,30		2,00	4,81
	CORREDOR 01		19,63	1,35		1,00	26,50
			1,10	1,35		2,00	2,97
			10,25	1,35		1,00	13,84
	CORREDOR 2		12,00	1,20		1,00	14,40
			1,00	1,20		1,00	1,20
	SALA 6		3,30	1,60		1,00	5,28
			2,50	1,60		1,00	4,00
	SALA 7		3,30	1,50		1,00	4,95
			2,55	1,50		1,00	3,83
	SALA 8		3,30	1,30		1,00	4,29
			3,60	1,30		2,00	9,36
	SALA 9		3,30	2,00		2,00	13,20
			2,95	2,00		1,00	5,90
	SALA 10		3,10	2,00		1,00	6,20
			2,75	2,00		1,00	5,50
	SALA 11		3,85	2,00		1,00	7,70
			4,40	2,00		1,00	8,80
			2,00	2,00		1,00	4,00
	HALL DE ENTRADA		1,63	1,60		2,00	5,22
			4,90	1,60		1,00	7,84
	AUDITORIO DA PARTE DO VIDRO PARA DENTRO		5,43	1,60		1,00	8,69
			3,90	1,60		2,00	12,48
			13,30	1,60		2,00	42,56
	FACHADA		1,80	0,80		1,00	1,44
			1,00	1,10		1,00	1,10
			1,20	0,72		1,00	0,86
			1,08	1,10		1,00	1,19
			2,40	0,63		1,00	1,51
			0,70	1,10		1,00	0,77
			1,50	0,50		1,00	0,75
	LATERAL		15,08	0,50		2,00	15,08
	LOCAIS ACIMA DO FORRO		0,60	0,60		1,00	0,36
			1,00	1,00		1,00	1,00
			1,00	1,00		1,00	1,00
			0,60	1,00		1,00	0,60
			0,60	0,60		1,00	0,36
	WC		2,50	2,80		1,00	7,00
						TOTAL	290,98
						SALDO CONTRATO	263,04
						ADITIVO	27,94
						MEDIDO 1 BM ADITIVO	27,86
						SALDO PARA 2 BM ADITIVO	0,08
87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 06/2014	M2					
	QUANTIDADE PREVISTAS NAS SALAS						434,44

LOCAL: Praça professor Urbano Gomes de Sá Salgueiro/PE

OBJETO: Reforma do prédio da Câmara municipal de vereadores do município de Salgueiro PE

MEMORIA DE CALCULO - 2 BM ADITIVO 01

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA	REPETIÇÕES	TOTAL
	WC'S 1		7,30	3,00		1,00	21,90
	COPA (SÓ AS PAREDES DOS CANTOS EM VISTA QUE PARTEDE QUE DIVIDIA A SALA FOI DEMOLIDA E JÁ ESTAVA PREVISTA)		3,70	3,35		1,00	12,40
						TOTAL	468,74
						SALDO CONTRATO	434,44
						ADITIVO	34,30
101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_08/2020	M2					
	AUDITORIO DA PARTE DO VIDRO PARA DENTRO		5,43	3,90			21,18
			4,90	3,90			19,11
						TOTAL	40,29
	SALDO CONTRATO						37,39
	SALDO PARA ADITIVO						2,90
96369	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M2					
	QUANTIDADE PREVISTA						19,64
	FECHAMENTO DE PORTA		0,80	2,10			1,68
						TOTAL	21,32
	SALDO CONTRATO						19,64
	SALDO PARA ADITIVO						1,68
COMP. 1	LUMINÁRIA DE TETO LED LONGA - APLIKLED BIVOLT LUZ BRANCA 40 W 5000K, OSRAM, COMPLETA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN					
	QUANTIDADE PREVISTA						14,00
	CORREDORES 1 E 2		7,00			1,00	7,00
						TOTAL	21,00
	SALDO CONTRATO						14,00
	SALDO PARA ADITIVO						7,00
99841	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXA DO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M					
	PROXIMO A RAMPAS		4,90			1,00	4,90
						TOTAL	4,90
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³					
	PAREDE COPA		2,55	3,00	0,15	1,00	1,15
						TOTAL	1,15
101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID					
			1,00			1,00	1,00
						TOTAL	1,00
101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID					
			1,00			1,00	1,00
						TOTAL	1,00



Documento assinado digitalmente
VINICIUS ALVES FERREIRA LUSTOSA FALCA
Data: 08/11/2022 01:37:20-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>

JN CONSTRUTORA LTDA EPP
Stenyo Rizzo Nascimento
Engº Civil
CREA 32.387 - D/PE

CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
BM 02

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:	CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO	MEDIÇÃO	02 ADITIVO 01
LOCAL:	SALGUEIRO	PERIODO	29/08/2022 a 04/11/2022
SERVIÇO:	REFORMA	DATA	04/11/2022
LOCAL DAS FOTOS:	CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO		

Imagem 01:




Imagem 2:



Imagem 3:



Imagem 4:

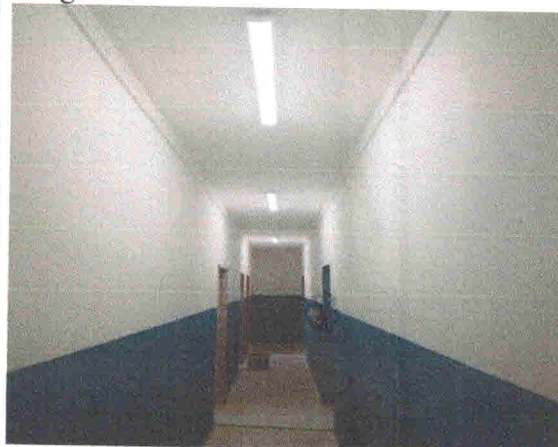

Documento assinado digitalmente
VINICIUS ALVES FERREIRA LUSTOSA FALCA
Data: 04/11/2022 01:52:26-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Fiscalização

JN CONSTRUTORA LTDA EPP
Stenyo Rizzo Nascimento
Engº Civil
CREA 32.387 - D/PE

J N Construtora LTDA
