

	ESTADO DO PERNAMBUCO PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO SECRETARIA DE FINANÇAS					Nota Nº 0000000576	
						SÉRIE	
						ELETRÔNICA	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
Data de Geração		29/08/2022		Competência		AGO/2022	
Nº do RPS		0		Local da Prestação		SALGUEIRO-PE	
				Nº da NFS-e Substituída		0	
				Optante do Simples		NÃO	
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO							
Razão Social		J. N. CONSTRUTORA LTDA - ME					
Nome Fantasia							
Endereço		RUA RUA PROJETADA 24/MONTE ALEGRE, S/N - NOSSA SRA.DAS GRACAS					
CPF/CNPJ		21.641.207/0001-15		Insc.Municipal		6605	
				UF		PE	
				Insc. Estadual		0	
Cidade		SALGUEIRO		C.E.P		56000000	
				Comp.		Q-B3A, L-02	
				Telefone			
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO				E-mail	
Endereço		PÇ PROF. URBANO DE SA, 00014 CAMARA SANTO ANTONIO 56000000 SALGUEIRO-PE					
CPF/CNPJ		11.351.350/0001-19		Insc. Municipal		0	
				Insc. Estadual			
				Telefone			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR Nº 01, DO CONTRATO Nº 012/2022, DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO, NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: BANCO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AGENCIA: 0776 / CONTA CORRENTE: 003 / CONTA : 00002413-3							
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO							
702 / 702 / 421110100 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica							
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL							
CÓDIGO DA OBRA					ART DA OBRA		
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS		0,00		COFINS		0,00	
				INSS		2.231,27	
				CSLL		0,00	
				IRRF		0,00	
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS		
Valor dos Serviços		33.807,10			Natureza da Operação		Valor dos Serviços
							33.807,10
(-) Desconto Incondicionado		0,00			Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei
							13.522,84
(-) Desconto condicionado		0,00			Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado
							0,00
(-) Retenções Federais		2.231,27			0-Nenhum		Base de Cálculo
							20.284,26
Outras Retenções		0,00			Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS
							5,0000 %
(-) ISS Retido		1.014,21			9vqbwt823		ISS a Reter
							(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido		30.561,62			http://www.salgueiro.pe.gov.br/		(=) Valor do ISS
							1.014,21
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
MÃO DE OBRA 60% / MATERIAL 40% EMPRESA ENQUADRADA NO LUCRO PRESUMIDO							
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Impressa em: 29/08/22 11:55 Hora da emissão: 11:52:58							

CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO			
Localização: Praça professor Urbano Gomes de Sá		Contratada: J N Construtora LTDA	
OBJETO:		CNPJ: 21.641.207/0001-15	
Reforma do prédio da Câmara municipal de vereadores do município de Salgueiro PE		Processo Licitatório: 006/2022	
Nº DO BM		Tomada de preço: 001/2022	
INÍCIO DA OBRA		TERMINO DA OBRA	
17/06/2022		17/09/2022	
R\$		VALOR DO CONTRATO	
		246.588,46	
		PERÍODO DE	
		17/06/2022 a 29/08/2022	

BM 01 ADITIVO

Item	Código	Descrição	Und	Valor Unitário (com BDI)	QUANTIDADE		FINANCEIRO		
					PREVISTO-A DITIVO	ACUMULADO	PREVISTO-ADITIVO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO
1.1	SERVIÇO								
1.1.1	S00051	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m2	379,76	6,00		R\$ 36.314,34	R\$ 1.890,14	R\$ 27.951,19
1.1.2	S11552	TAPUME EM TELHA DE ALUMÍNIO, ESP = 0,5 MM, H = 2 M, EXCLUSIVE PINTURA	m	313,33	44,25		R\$ 2.278,56	R\$ -	R\$ 2.278,56
1.1.3	S03258	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LAJOTA HEXAGONAL	m2	11,55	85,24		R\$ 13.864,85	R\$ -	R\$ 13.864,85
1.1.4	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	22,70	269,45		R\$ 984,52	R\$ -	R\$ 984,52
1.1.5	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M	2,60	311,83		R\$ 6.116,44	R\$ 1.350,80	R\$ 6.116,44
1.1.6	S07725	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m2	6,32	729,50		R\$ 810,75	R\$ 124,97	R\$ 810,75
1.1.7	S05055	REMOÇÃO DE PINTURA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE REMOVEDOR PASTOSO	m2	15,10	238,74		R\$ 4.810,44	R\$ -	R\$ -
1.1.8	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,79	145,15		R\$ 3.604,97	R\$ -	R\$ -
1.1.9	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	26,22	15,47		R\$ 695,27	R\$ -	R\$ 695,13
1.1.10	C3373	RETRIDA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	10,80	40,45		R\$ 405,62	R\$ -	R\$ 258,65
1.1.11	S00017	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	m2	7,91	290,98		R\$ 438,86	R\$ -	R\$ 436,86
1.1.12	97544	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	8,85	23,10		R\$ 2.301,62	R\$ 220,37	R\$ 2.301,00
1.2	OBRA						R\$ 204,44	R\$ -	R\$ 204,44
1.2.1	100328	RETRIDA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATE DUAS AGUAS, INCLUSIVE CIMENTO. AF_07/2019	M2	14,80	0,00		R\$ 8.581,44	R\$ -	R\$ 6.073,08
1.2.2	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M2	41,84	145,15		R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.3	S01952	SANCA OU CIMALHA EM GESSO L = 10 CM	m	10,99	228,24		R\$ 6.073,08	R\$ -	R\$ 6.073,08
1.3	ARGAMASSA						R\$ 2.508,36	R\$ -	R\$ -
1.3.1	S03311	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA, TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO/AREIA/ ADESIVO BRANCO) - REVISADO 08/2015	m2	9,63	290,98		R\$ 72.951,09	R\$ 1.418,07	R\$ 14.806,71
1.3.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	M2	41,27	290,98		R\$ 2.802,10	R\$ 269,29	R\$ 2.801,35
1.3.3	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	118,50	490,64		R\$ 12.008,74	R\$ 1.149,78	R\$ 12.005,36
1.4	PISO						R\$ 58.140,25	R\$ -	R\$ -
1.4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	53,31	40,45		R\$ 78.924,19	R\$ -	R\$ 5.771,68
1.4.2	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	79,44	127,40		R\$ 2.156,39	R\$ -	R\$ -
1.4.3	101094	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M	188,91	60,40		R\$ 10.120,66	R\$ -	R\$ -
1.4.4	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	223,28	40,29		R\$ 11.410,16	R\$ -	R\$ -
1.4.5	87620	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	29,35	196,65		R\$ 8.995,28	R\$ -	R\$ -
1.4.6	87283	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	180,90	196,65		R\$ 5.771,68	R\$ -	R\$ 5.771,68

Stenyo Rizzo Nascimento
Engº Civil
CREA 32.307 - DPE

Vinicius Alves Ferreira Lustosa Falcão
Engenheiro Civil
PE 19357575 PE RNP 061935757-4
CREA: PE 19357575 PE RNP 061935757-4

CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO			
Localização: Praça professor Urbano Gomes de Sá	Contratada: J N Construtora LTDA CNPJ: 21.841.207/0001-15		
OBJETO: Reforma do prédio da Câmara municipal de vereadores do município de Salgueiro PE	Processo Licitatório: 008/2022 Tomada de preço: 001/2022		
Nº DO BM			
INÍCIO DA OBRA 17/05/2022	TERMINO DA OBRA 17/05/2022	VALOR DO CONTRATO R\$ 246.558,46	PERÍODO DE 17/05/2022 a 28/08/2022

BM 01 ADITIVO

Item	Codigo	Descrição	Und	Valor Unitário (com BDI)	QUANTIDADE		FINANCEIRO	
					PREVISTO+ADITIVO	ACUMULADO	PREVISTO+ADITIVO	ACUMULADO
					DTIVO	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO	
1.4.7	S02276	RODAPE CERÂMICO 10 X 45 CM, PORCELANATO, BIANCO TU POLDIO, LINHA PROGETTO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO	m	24,61	83,35	0,00	R\$ 2.051,24	R\$ -
1.4.8	S09584	SOLEIRA EM GRANITO POLDIO PRETO L = 22, ESP = 3 CM	m	132,97	13,83	0,00	R\$ 1.812,38	R\$ -
1.4.9	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	5,25	196,65	0,00	R\$ 1.032,41	R\$ -
1.5	PINTURA						R\$ 31.049,45	R\$ -
1.5.1	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOES. AF_05/2017	M2	24,98	138,59	0,00	R\$ 3.461,98	R\$ -
1.5.2	88487	APLICAÇÃO E LUXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_06/2014	M2	14,15	513,07	0,00	R\$ 7.259,94	R\$ -
1.5.3	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,92	651,86	0,00	R\$ 1.902,85	R\$ -
1.5.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_06/2014	M2	16,26	588,66	0,00	R\$ 9.571,61	R\$ -
1.5.5	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3,34	235,61	0,00	R\$ 786,94	R\$ -
1.5.6	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOES. AF_06/2014	M2	18,23	235,61	0,00	R\$ 4.295,17	R\$ -
1.5.7	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOES. AF_07/2021	M2	28,04	46,86	0,00	R\$ 1.313,95	R\$ -
1.5.8	100745	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 P	M2	22,90	54,10	0,00	R\$ 1.238,89	R\$ -
1.5.9	102225	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA MODIFICADA) 3 DEMÃOES. AF_07/2021	M2	26,23	46,44	0,00	R\$ 1.218,12	R\$ -
1.6	ESBORÃO						R\$ 14.806,51	R\$ -
1.6.1	100681	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMILOCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	UN	956,13	4,00	0,00	R\$ 3.824,52	R\$ -
1.6.2	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMILOCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	UN	1.008,21	9,00	0,00	R\$ 9.073,89	R\$ -
1.6.3	81315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMILOCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	UN	854,05	2,00	0,00	R\$ 1.708,10	R\$ -
1.7	DIVERSO						R\$ 11.764,60	R\$ -
1.7.1	96389	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, COM VAOS. AF_06/2017_P	M2	229,40	21,32	0,00	R\$ 4.890,81	R\$ -
1.7.2	COMP. 1	LUMINARIA DE TETO LED LONGA - APLIKLED BIVOLT LUZ BRANCA 40 W 5000K, OSRAM, COMPLETA, INCLUSIVE INSTALACAO	UN	137,05	21,00	0,00	R\$ 2.878,05	R\$ -
1.7.3	S08759	CORRIMÃO EM AÇO INOX ø=1 1/2", DUPLO, H = 90 CM	m	327,52	12,20	0,00	R\$ 3.995,74	R\$ -
1.7	EXTRAS						R\$ 32.463,00	R\$ 30.092,89
	COMPOSIÇÃO 1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, COM EMBOCAMENTO EM CADA ENCAIXE DE TELHA. AF_07/2016	M2	83,48	280,16	280,16	R\$ 23.390,56	R\$ 23.390,56
	94232	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2016	Un	3,09	1.920,00	1.920,00	R\$ 5.932,80	R\$ 5.932,80

Vinicius A.F.L.F.
Vinicius Alves Ferreira Lustosa Falcão
Engenheiro Civil
CREA: PE19357575 PE RNP: 061935757-6

Stênio Pizzo Nascimento
Engº Civil
CREA 32.387 - DIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO			
Localização: Praça professor Urbano Gomes de Sá		Contratada: J N Construtora LTDA	
OBJETO: Reforma do prédio da Câmara municipal de vereadores do município de Salgueiro PE		CNPJ: 21.641.207/0001-15	
Nº DO BM		Processo Licitatório: 008/2022	
INÍCIO DA OBRA		Tomada de preço: 001/2022	
17/06/2022		17/06/2022	
TERMINO DA OBRA		VALOR DO CONTRATO	
17/08/2022		R\$ 246.568,46	
PERÍODO DE		17/06/2022 a 28/08/2022	

BM 01 ADITIVO

Item	Código	Descrição	Und	Valor Unitário (com BDI)	QUANTIDADE		FINANCEIRO	
					PREVISTO+ADITIVO	ACUMULADO	PREVISTO+ADITIVO	ACUMULADO
	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	3,37	280,16	280,16	R\$ 944,14	R\$ 944,14
	11.05.070	CAPEAO DE REVESTIMENTO EM MASSA ÚNICA, PARA ALVENARIA DE 15CM DE ESPESURA, COM ARGAMASSA MISTA DE CAL, HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRACO 1/4, COM ADICAO DE 130 KG DE CIMENTO, ESPESURA DE 20MM, INCLUSIVE CHAPISCO NO TRACO 1/3.(SEDUC)	M	7,21	59,00	59,00	R\$ 425,39	R\$ 425,39
	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M²	88,65	19,99		R\$ 1.772,11	R\$ -
	99841	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXA DO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 P	M	1.255,26	4,90		R\$ 6.150,77	R\$ -
	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	52,77	1,15		R\$ 60,55	R\$ -
	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UNID	160,16	1,00		R\$ 160,16	R\$ -
	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UNID	84,16	1,00		R\$ 84,16	R\$ -
							R\$ 33.807,10	R\$ -

Vinicius F.F.F.
Vinicius Alves Ferreira Lustosa Falcão
Engenheiro Civil
CREA: PE19357575 PE RNP: 061935757-6

Stenjo Rizzo Nascimento
Engº Civil
CREA 32387 - DIPE

LOCAL: Praça professor Urbano Gomes de Sá Salgueiro/PE

OBJETO: Reforma do prédio da Câmara municipal de vereadores do município de Salgueiro PE

MEMORIA DE CALCULO - 1 BM ADITIVO

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA	REPETIÇÕES	TOTAL
97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2					
	SALA 1		3,10	2,50			7,75
	SALA 2		3,10	2,60			8,06
	SALA 3		3,10	2,60			8,06
	SALA 4		2,55	2,35			5,99
	WC MASCULINO		2,55	1,10			2,81
	PAREDE		7,30	2,80			20,44
	WC FEMININO		2,55	1,10			2,81
	COPA		2,55	1,85			4,72
	SALA 5		2,55	1,85			4,72
	CORREDOR 01		19,63	1,10			21,59
	HALL DE ENTRADA		4,90	1,63			7,99
	AUDITORIO DA PARTE DO VIDRO PARA DENTRO		5,43	3,90			21,18
			4,90	13,30			65,17
	CORREDOR 2		12,00	1,00			12,00
	SALA 6		3,30	2,50			8,25
	SALA 7		3,30	2,55			8,42
	SALA 8		3,30	3,60			11,88
	SALA 9		3,30	2,95			9,74
	SALA 10		3,10	2,75			8,53
	SALA 11		3,85	4,40			16,94
	WC 03 PISO		2,50	1,15			2,88
	SOLEIRA		5,00	2,00			10,00
						TOTAL	269,89
	MEDIDO NO 1 BM						209,94
	SALDO PARA ADITIVO						59,95
97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M					
	SALA 1		3,10	2,50		2,00	15,50
	SALA 2		3,10	2,60		2,00	16,12
	SALA 3		3,10	2,60		2,00	16,12
	SALA 4		2,55	2,35		2,00	11,99
	SALA 5		2,55	1,85		2,00	9,44
	CORREDOR 01		19,63	1,10		2,00	43,19
	HALL DE ENTRADA		1,63			2,00	3,26
			4,90			1,00	4,90
	AUDITORIO DA PARTE DO VIDRO PARA DENTRO		5,43			1,00	5,43
			3,90			2,00	7,80
			13,30			2,00	26,60
	CORREDOR 2		12,00	1,00		2,00	24,00
	SALA 6		3,30	2,50		2,00	16,50
	SALA 7		3,30	2,55		2,00	16,83
	SALA 8		3,30	3,60		2,00	23,76
	SALA 9		3,30	2,95		2,00	19,47
	SALA 10		3,10	2,75		2,00	17,05
	SALA 11		3,85	4,40		2,00	33,88
						TOTAL	311,83
	MEDIDO NO PERÍODO						263,76
	SALDO PARA ADITIVO						48,07
500017	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	m2					
	SALA 1		3,10	1,40		1,00	4,34
			2,50	1,40		2,00	7,00
	SALA 2		3,00	1,00		1,00	3,00
	SALA 3		3,00	1,25		1,00	3,75
			0,70	1,25		1,00	0,88
	SALA 4		2,55	1,50		1,00	3,83
			2,35	1,50		1,00	3,53
			1,00	1,50		1,00	1,50
	SALA 5		2,55	1,30		2,00	6,63
			1,85	1,30		2,00	4,81
	CORREDOR 01		19,63	1,35		1,00	26,50
			1,10	1,35		2,00	2,97
			10,25	1,35		1,00	13,84
	CORREDOR 2		12,00	1,20		1,00	14,40
			1,00	1,20		1,00	1,20
	SALA 6		3,30	1,60		1,00	5,28
			2,50	1,60		1,00	4,00
	SALA 7		3,30	1,50		1,00	4,95
			2,55	1,50		1,00	3,83
	SALA 8		3,30	1,30		1,00	4,29
			3,60	1,30		2,00	9,36
	SALA 9		3,30	2,00		2,00	13,20
			2,95	2,00		1,00	5,90
	SALA 10		3,10	2,00		1,00	6,20
			2,75	2,00		1,00	5,50
	SALA 11		3,85	2,00		1,00	7,70
			4,40	2,00		1,00	8,80
			2,00	2,00		1,00	4,00
	HALL DE ENTRADA		1,63	1,60		2,00	5,22
			4,90	1,60		1,00	7,84
	AUDITORIO DA PARTE DO VIDRO PARA DENTRO		5,43	1,60		1,00	8,69

Vinicius A.F.L.F.

Vinicius Alves Ferreira Lustosa Falcão

Engenheiro Civil

CREA 22.387 - C

LOCAL: Praça professor Urbano Gomes de Sá Salgueiro/PE

OBJETO: Reforma do prédio da Câmara municipal de vereadores do município de Salgueiro PE

MEMORIA DE CALCULO - 1 BM ADITIVO

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA	REPETIÇÕES	TOTAL
			3,90	1,60		2,00	12,48
			13,30	1,60		2,00	42,56
	FACHADA		1,80	0,80		1,00	1,44
			1,00	1,10		1,00	1,10
			1,20	0,72		1,00	0,86
			1,08	1,10		1,00	1,19
			2,40	0,63		1,00	1,51
			0,70	1,10		1,00	0,77
			1,50	0,50		1,00	0,75
	LATERAL		7,00	0,80		2,00	11,20
			2,00	1,90		1,00	3,80
	LOCAIS ACIMA DO FORRO		0,60	0,60		1,00	0,36
			1,00	1,00		1,00	1,00
			1,00	1,00		1,00	1,00
			0,60	1,00		1,00	0,60
			0,60	0,60		1,00	0,36
	WC		2,50	2,80		1,00	7,00
						TOTAL	290,90
						SALDO CONTRATO	263,04
						ADITIVO	27,86
503311	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO/AREIA/ ADESIVO BIANCO) - REVISADO 08/2015	m2					
	SALA 1		3,10	1,40		1,00	4,34
			2,50	1,40		2,00	7,00
	SALA 2		3,00	1,00		1,00	3,00
	SALA 3		3,00	1,25		1,00	3,75
			0,70	1,25		1,00	0,88
	SALA 4		2,55	1,50		1,00	3,83
			2,35	1,50		1,00	3,53
			1,00	1,50		1,00	1,50
	SALA 5		2,55	1,30		2,00	6,63
			1,85	1,30		2,00	4,81
	CORREDOR 01		19,63	1,35		1,00	26,50
			1,10	1,35		2,00	2,97
			10,25	1,35		1,00	13,84
	CORREDOR 2		12,00	1,20		1,00	14,40
			1,00	1,20		1,00	1,20
	SALA 6		3,30	1,60		1,00	5,28
			2,50	1,60		1,00	4,00
	SALA 7		3,30	1,50		1,00	4,95
			2,55	1,50		1,00	3,83
	SALA 8		3,30	1,30		1,00	4,29
			3,60	1,30		2,00	9,36
	SALA 9		3,30	2,00		2,00	13,20
			2,95	2,00		1,00	5,90
	SALA 10		3,10	2,00		1,00	6,20
			2,75	2,00		1,00	5,50
	SALA 11		3,85	2,00		1,00	7,70
			4,40	2,00		1,00	8,80
			2,00	2,00		1,00	4,00
	HALL DE ENTRADA		1,63	1,60		2,00	5,22
			4,90	1,60		1,00	7,84
	AUDITORIO DA PARTE DO VIDRO PARA DENTRO		5,43	1,60		1,00	8,69
			3,90	1,60		2,00	12,48
			13,30	1,60		2,00	42,56
	FACHADA		1,80	0,80		1,00	1,44
			1,00	1,10		1,00	1,10
			1,20	0,72		1,00	0,86
			1,08	1,10		1,00	1,19
			2,40	0,63		1,00	1,51
			0,70	1,10		1,00	0,77
			1,50	0,50		1,00	0,75
	LATERAL		7,00	0,80		2,00	11,20
			2,00	1,90		1,00	3,80
	LOCAIS ACIMA DO FORRO		0,60	0,60		1,00	0,36
			1,00	1,00		1,00	1,00
			1,00	1,00		1,00	1,00
			0,60	1,00		1,00	0,60
			0,60	0,60		1,00	0,36
	WC		2,50	2,80		1,00	7,00
						TOTAL	290,90
						SALDO CONTRATO	263,04
						ADITIVO	27,86
67530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	M2					
	SALA 1		3,10	1,40		1,00	4,34
			2,50	1,40		2,00	7,00
	SALA 2		3,00	1,00		1,00	3,00
	SALA 3		3,00	1,25		1,00	3,75
			0,70	1,25		1,00	0,88
	SALA 4		2,55	1,50		1,00	3,83

Vinicius A.F.F.
Vinicius Alves Ferreira Lustosa Falcão
Engenheiro Civil
CREA PE 133575-3 E 240 561935757-6

Stacyo Rêgo Nascimento
Engenheiro Civil
CREA 32.387 - D

LOCAL: Praça professor Urbano Gomes de Sá Salgueiro/PE							
OBJETO: Reforma do prédio da Câmara municipal de vereadores do município de Salgueiro PE							
MEMORIA DE CALCULO - 1 BM ADITIVO							
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA	REPETIÇÕES	TOTAL
			2,35	1,50		1,00	3,53
			1,00	1,50		1,00	1,50
	SALA 5		2,55	1,30		2,00	6,63
			1,85	1,30		2,00	4,81
	CORREDOR 01		19,63	1,35		1,00	26,50
			1,10	1,35		2,00	2,97
			10,25	1,35		1,00	13,84
	CORREDOR 2		12,00	1,20		1,00	14,40
			1,00	1,20		1,00	1,20
	SALA 6		3,30	1,60		1,00	5,28
			2,50	1,60		1,00	4,00
	SALA 7		3,30	1,50		1,00	4,95
			2,55	1,50		1,00	3,83
	SALA 8		3,30	1,30		1,00	4,29
			3,60	1,30		2,00	9,36
	SALA 9		3,30	2,00		2,00	13,20
			2,95	2,00		1,00	5,90
	SALA 10		3,10	2,00		1,00	6,20
			2,75	2,00		1,00	5,50
	SALA 11		3,85	2,00		1,00	7,70
			4,40	2,00		1,00	8,60
			2,00	2,00		1,00	4,00
	HALL DE ENTRADA		1,63	1,60		2,00	5,22
			4,90	1,60		1,00	7,84
	AUDITORIO DA PARTE DO VIDRO PARA DENTRO		5,43	1,60		1,00	8,69
			3,90	1,60		2,00	12,48
			13,30	1,60		2,00	42,56
	FACHADA		1,80	0,80		1,00	1,44
			1,00	1,10		1,00	1,10
			1,20	0,72		1,00	0,86
			1,08	1,10		1,00	1,19
			2,40	0,63		1,00	1,51
			0,70	1,10		1,00	0,77
			1,50	0,50		1,00	0,75
	LATERAL		7,00	0,80		2,00	11,20
			2,00	1,90		1,00	3,80
	LOCAIS ACIMA DO FORRO		0,60	0,60		1,00	0,36
			1,00	1,00		1,00	1,00
			1,00	1,00		1,00	1,00
			0,60	1,00		1,00	0,60
			0,60	0,60		1,00	0,36
	WC		2,50	2,80			7,00
						TOTAL	290,90
						SALDO CONTRATO	263,04
						ADITIVO	27,86
COMPOSIÇÃO	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, COM EMBOCAMENTO EM CADA ENCADE DE TELHA.	m2					
	SALA 1		3,10	2,50		1,00	7,75
	SALA 2		3,10	2,52		1,00	7,81
	SALA 3		3,10	2,52		1,00	7,81
	SALA 4		2,55	2,35		1,00	5,99
	WC MASC		2,55	1,10		1,00	2,81
	WC FEM		2,55	1,10		1,00	2,81
	COPA		2,55	1,85		1,00	4,72
	SALA 5		2,55	1,85		1,00	4,72
	CORREDOR 01		18,90	1,10		1,00	20,79
	HALL DE ENTRADA		4,90	1,63		1,00	7,99
	AUDITORIO		4,90	9,55		1,00	46,80
	PLATOR		4,90	7,80		1,00	38,22
	CORREDOR 02		12,00	1,00		1,00	12,00
	SALA 6		3,30	2,50		1,00	8,25
	SALA 7		3,30	2,55		1,00	8,42
	SALA 8		3,30	3,60		1,00	11,88
	SALA 9		3,30	2,95		1,00	9,74
	SALA 10		3,10	2,75		1,00	8,53
	SALA 11		3,85	4,40		1,00	16,94
	WC 03		2,50	1,15		1,00	2,88
	AREA SOBRE AS PAREDES		30,00	1,00		1,00	30,00
							266,82
	INCLINAÇÃO 30%		266,82			1,05	280,16
94232	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	Un					
	AMARRAÇÃO TELHAS ENTRE LINHA DE MADEIRA		120,00	16,00		1,00	1920,00
						TOTAL	1920,00
97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCEMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²					
	SALA 1		3,10	2,50		1,00	7,75
	SALA 2		3,10	2,52		1,00	7,81
	SALA 3		3,10	2,52		1,00	7,81

Vinicius A.F.C.
Vinicius Alves Ferreira Lustosa Falcão
Engenheiro Civil
CREA PE 0055771 DE RVP 18/03/2015-6

ANEXO 02
12/03/2017
12/03/2017 - D/P

LOCAL: Praça professor Urbano Gomes de Sá Salgueiro/PE

OBJETO: Reforma do prédio da Câmara municipal de vereadores do município de Salgueiro PE

MEMORIA DE CÁLCULO - 1 BM ADITIVO

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA	REPETIÇÕES	TOTAL
	SALA 4		2,55	2,35		1,00	5,99
	WC MASC		2,55	1,10		1,00	2,81
	WC FEM		2,55	1,10		1,00	2,81
	COPA		2,55	1,85		1,00	4,72
	SALA 5		2,55	1,85		1,00	4,72
	CORREDOR 01		18,90	1,10		1,00	20,79
	HALL DE ENTRADA		4,90	1,63		1,00	7,99
	AUDITORIO		4,90	9,55		1,00	46,80
	PLATOR		4,90	7,80		1,00	38,22
	CORREDOR 02		12,00	1,00		1,00	12,00
	SALA 6		3,30	2,50		1,00	8,25
	SALA 7		3,30	2,55		1,00	8,42
	SALA 8		3,30	3,60		1,00	11,88
	SALA 9		3,30	2,95		1,00	9,74
	SALA 10		3,10	2,75		1,00	8,53
	SALA 11		3,85	4,40		1,00	16,94
	WC 03		2,50	1,15		1,00	2,88
	AREA SOBRE AS PAREDES		30,00	1,00		1,00	30,00
							266,82
	INCLINAÇÃO 30%		266,82			1,05	280,16
11,05,070	CAPEACO DE REVESTIMENTO EM MASSA UNICA, PARA ALVENARIA DE 15CM DE ESPESSURA, COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4, COM ADICAO DE 130 KG DE CIMENTO, ESPESSURA DE 20MM, INCLUSIVE CHAPISCO NO TRACO 1:3,(SEDUC)	M					
	FACHADA		8,60			4,00	34,40
			0,45			4,00	1,80
			1,95			4,00	7,80
	DESENHO DAS FLORES		5,00			3,00	15,00
						TOTAL	59,00

Vinicius A.F.L.F.
Vinicius Alves Ferreira Lustosa Falcão
Engenheiro Civil
CREA: PE1935757-6

Stenyo P. Nascimento
Engenheiro Civil
CREA: 32.387 - D/PE

CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
BM 01

COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO
FLS: 071

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:	CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO	MEDIÇÃO	BM 1 ADITIVO
LOCAL:	SALGUEIRO	PERÍODO	17/06 À 29/08
SERVIÇO:	REFORMA	DATA	29/08/2022
LOCAL DAS FOTOS:	CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO		

Imagem 01:

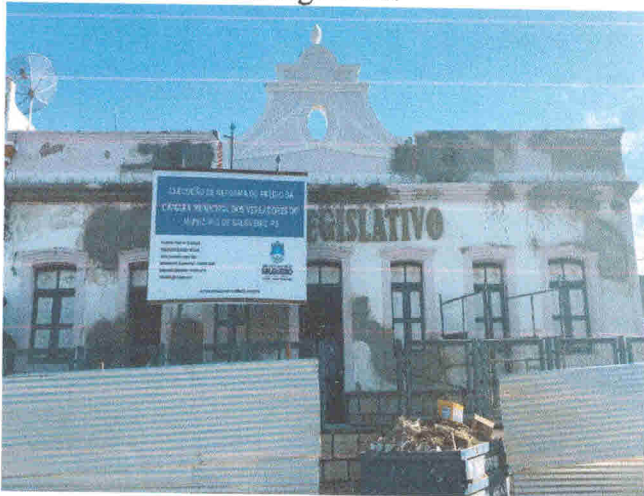


Imagem 2:

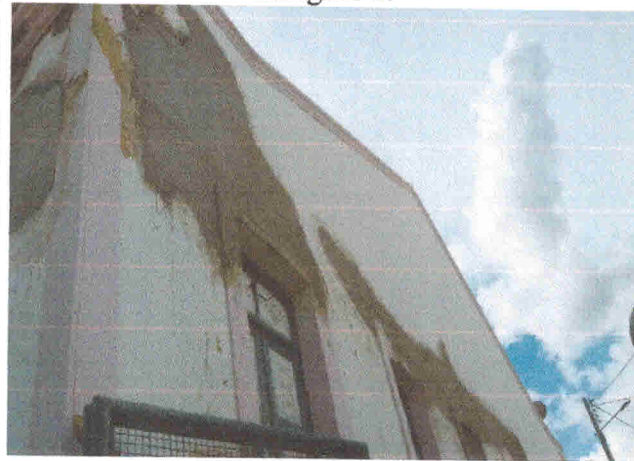


Imagem 3:



Imagem 4:



Vinicius A.F.L.F.
Fiscalização

Vinicius Alves Ferreira Lustosa Falcão
Engenheiro Civil
CREA: PE15357575 PE RNP: 061935757-6

Stenyo Rizzo Nascimento
Engº Civil
CREA 32 387 - D/PE
J N Construtora LTDA

CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
BM 01

COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO
FLS: 072

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:	CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO	MEDIÇÃO	BM 1 ADITIVO
LOCAL:	SALGUEIRO	PERÍODO	17/06 À 29/08
SERVIÇO:	REFORMA	DATA	29/08/2022
LOCAL DAS FOTOS:	CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO		

Imagem 5:

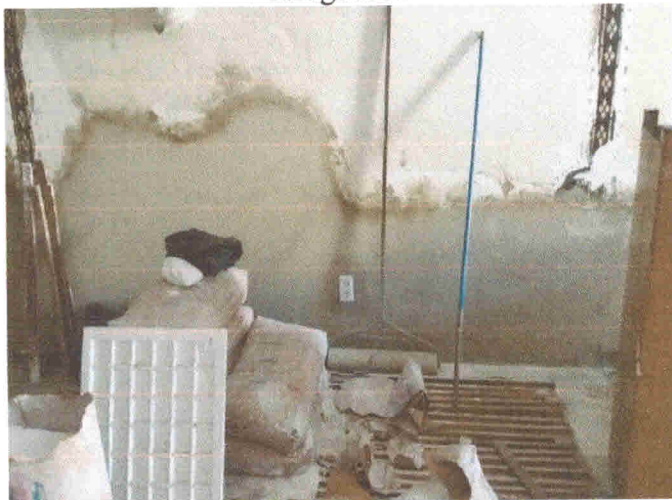



Imagem 6:



Imagem 7:



Imagem 8:

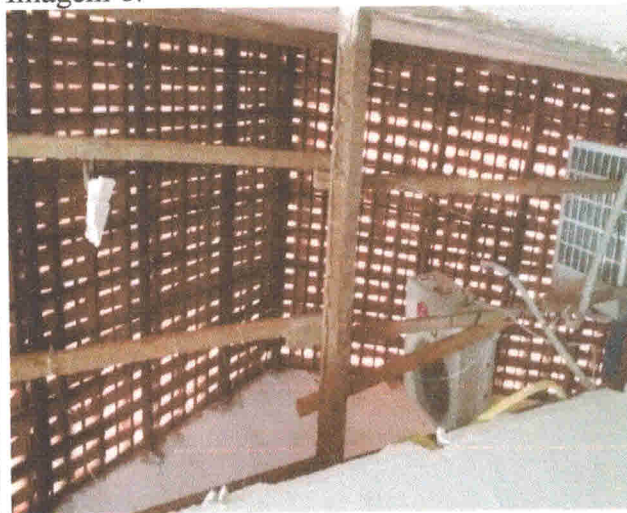

Vinicius A.F.F.

Fiscalização

Vinicius Alves Ferreira Lustosa Falcão
Engenheiro Civil
CREA: PE19357575 PE RNP. 061935757-6

Stenyo Rizzo Nascimento
Engº Civil
CREA 32 387 - DIPE

J N Construtora LTDA

CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
BM 01

COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO
FLS: 073

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:	CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO	MEDIÇÃO	BM 1 ADITIVO
LOCAL:	SALGUEIRO	PERÍODO	17/06 Á 29/08
SERVIÇO:	REFORMA	DATA	29/08/2022
LOCAL DAS FOTOS:	CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO		

Imagem 9:



Vinicius A.F.L.F.

Fiscalização

Vinicius Alves Ferreira Lustosa Falcão
Engenheiro Civil
CREA: PE1935757-6 PE RNP. 061935757-6

Stenyo Rizzo Nascimento
Engº Civil
CREA 32 387 - DIPE

J N Construtora LTDA

CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO				
Contratada: J N Construtora LTDA CNPJ: 21.841.207/0001-15				
Processo Licitatório: 008/2022 Tomada de preço: 001/2022				
TERMINO DA OBRA 17/08/2022				
INICIO DA OBRA 17/08/2022				
VALOR DO CONTRATO R\$ 246.588,48				
PERÍODO DE 17/08/2022 a 28/08/2022				

BM 01 ADITIVO 01

Item	Código	Descrição	Und	Valor Unitário (com BDI)	QUANTIDADE		FINANCEIRO	
					ADITIVO 01	MEDIO NO PERÍODO	ADITIVO 01	MEDIO NO PERÍODO
1.1	SERVIÇO							
1.1.4	97833	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	22,70	59,51	59,51	R\$ 1.350,80	R\$ 1.350,80
1.1.5	97832	DEMOLIÇÃO DE RODAPE CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M	2,60	48,07	48,07	R\$ 124,97	R\$ 124,97
1.1.11	S00017	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	m2	7,91	27,94	27,94	R\$ 220,37	R\$ 220,37
1.3	ARGAMASSA							
1.3.1	S03311	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-1:3 (CIMENTO/AREIA/ ADESIVO BRANCO) REVISADO 08/2015	m2	9,63	27,94	27,94	R\$ 269,02	R\$ 269,02
1.3.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	M2	41,27	27,94	27,94	R\$ 1.153,08	R\$ 1.149,78
1.3.3	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	118,50	56,20	56,20	R\$ 6.659,11	R\$ -
1.4	PISO							
1.4.4	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_08/2020	M2	223,28	2,90	2,90	R\$ 646,84	R\$ -
1.7	DIVERSO							
1.7.1	98369	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÁOS. AF_08/2017_P	M2	229,40	1,88	1,88	R\$ 385,39	R\$ -
1.7.2	COMP. 1	LUMINÁRIA DE TETO LED LONGA - APLIKED BIVOLT LUZ BRANCA 40 W 5000K, OSRAM, COMPLETA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	137,05	7,00	7,00	R\$ 959,35	R\$ -
1.7	EXTRAS							
1.7.1	COMPOSIÇÃO 1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, COM EMBOCAMENTO EM CADA ENCADE DE TELHA. AF_07/2019	M2	63,49	280,16	280,16	R\$ 23.390,56	R\$ 23.390,56
1.7.2	84232	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	Un	3,09	1.920,00	1.920,00	R\$ 5.932,80	R\$ 5.932,80
1.7.3	87847	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROGIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	3,37	280,16	280,16	R\$ 944,14	R\$ 944,14
1.7.4	11.05.070	CAPEAO DE REVESTIMENTO EM MASSA ÚNICA, PARA ALVENARIA DE 15CM DE ESPESSURA, COM ARGAMASSA MISTA DE CAL, HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4, COM ADICAO DE 130 KG DE CIMENTO, ESPESSURA DE 20MM, INCLUSIVE CHAPISCO NO TRAÇO 1:3.(SEUCJ) DE 130 KG DE CIMENTO. AF_04/2019_P	M	7,21	59,00	59,00	R\$ 425,39	R\$ 425,39
1.7.5	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_08/2014	M²	88,65	19,99	19,99	R\$ 1.772,11	R\$ -
1.7.6	98841	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXA DO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	1.255,26	4,90	4,90	R\$ 6.150,77	R\$ -
1.7.7	87622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	52,77	1,15	1,15	R\$ 60,55	R\$ -
1.7.8	101945	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	160,16	1,00	1,00	R\$ 160,16	R\$ -
1.7.9	101676	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	84,16	1,00	1,00	R\$ 84,16	R\$ -
							R\$ 33.807,10	

JN CONSTRUTORA LTDA EPP
Stenio Rizzo Nascimento
Engº Civil
CREA 32.387 - DPE

Localização: Praça professor Urbano Gomes de Sá

Contratada: J N Construtora LTDA

CNPJ: 21.641.207/0001-15

Processo Licitatório: 008/2022

Tomada de preço: 001/2022

TERMINO DA OBRA

17/08/2022

OBJETO:

Reforma do prédio da Câmara municipal dos vereadores do município de Salgueiro PE

Nº DO BM

1

INICIO DA OBRA

17/08/2022

VALOR DO CONTRATO

R\$ 246.588,46

PERÍODO DE

17/08/2022 a 28/08/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO

BM 01 ADITIVO 01

Item	Código	Descrição	Und	Valor Unitário (com BDI)	QUANTIDADE		FINANCEIRO				
					ADITIVO 01	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO	ADITIVO 01	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO	
1.1	SERVIÇO							R\$	R\$	R\$	
1.1.4	87633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	22,70	59,51	59,51	59,51	R\$	1.350,80	R\$	1.350,80
1.1.5	87632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÊ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	2,60	48,07	48,07	48,07	R\$	124,97	R\$	124,97
1.1.11	S00017	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	m2	7,91	27,94	27,94	27,94	R\$	220,97	R\$	220,97
1.3	ARGAMASSA							R\$	8.081,21	R\$	1.418,07
1.3.1	S03311	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRACO T2 - 1:3 (CIMENTO/AREIA/ ADESIVO BRANCO) - REVISADO 08/2015	m2	9,63	27,94	27,94	27,94	R\$	269,02	R\$	268,29
1.3.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE DETALHES. AF_08/2014	M2	41,27	27,94	27,94	27,94	R\$	1.153,08	R\$	1.149,78
1.3.3	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	118,50	56,20		0,00	R\$	6.659,11	R\$	-
1.4	PISO							R\$	646,84	R\$	-
1.4.4	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_08/2020	M2	223,28	2,90		0,00	R\$	646,84	R\$	-
1.7	DIVERSOS							R\$	1.344,74	R\$	-
1.7.1	86389	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	229,40	1,68		0,00	R\$	385,39	R\$	-
1.7.2	COMP. 1	LUMINÁRIA DE TETO LED LONGA - APLIKLED BIVOLT LUZ BRANCA 40 W 5000K, OSRAM, COMPLETA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	137,05	7,00		0,00	R\$	959,35	R\$	-
1.7	EXTRAS							R\$	32.465,00	R\$	30.692,89
	COMPOSIÇÃO 1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, COM EMBOCAMENTO EM CADA ENCAIXE DE TELHA. AF_07/2019	M2	83,49	280,16	280,16	280,16	R\$	23.390,56	R\$	23.390,56
84232		AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	Un	3,09	1.920,00	1.920,00	1.920,00	R\$	5.932,80	R\$	5.932,80
87647		REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	3,37	280,16	280,16	280,16	R\$	944,14	R\$	944,14
		CAPEAÇO DE REVESTIMENTO EM MASSA ÚNICA, PARA ALVENARIA DE 15CM DE ESPESSURA, COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4, COM ADICAO DE 130 KG DE CIMENTO. ESPESSURA DE 20MM, INCLUSIVE CHAPISCO NO TRACO 1:3.(SEJUCO) AF_08/2014	M	7,21	59,00	59,00	59,00	R\$	425,39	R\$	425,39
87273		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	88,65	19,99			R\$	1.772,11	R\$	-
98841		GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM. FIXAÇÃO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	1.255,26	4,90			R\$	6.150,77	R\$	-
97622		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	52,77	1,15			R\$	60,55	R\$	-
101946		QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	160,16	1,00			R\$	160,16	R\$	-
101876		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	84,16	1,00			R\$	84,16	R\$	-
								R\$	33.807,10		

JN CONSTRUTORA LTDA EPP
Sleny Rizzo Nascimento
Engº Civil
CREA 32.387 - DPE
